

# ルシャ川 小規模治山工事概要について《今年度工事内容説明》 (R5.7.19)

## 内容

令和元年度より6カ年計画の5年目として実施。第1ダムについて幅15m、高さ170cmの切り下げを施工した。切り下げ工事については、例年どおりカラフトマス、シロザケの遡上に配慮し、8月10日までに完了予定。第3ダム上流で、人為的に土砂を盛り、河道が狭くなって一部区間の開削を現在施工中。今後の作業は、切り出したコンクリート塊の現場外搬出処理を予定している。モニタリング調査として、河床地形調査、流況調査を7月～11月に4回実施し、シロザケの産卵床調査を10月～11月に実施。

第1ダム切り下げ前




撮影日 R4.6.18

第3ダム

第2ダム

第1ダム

R05 イメージ図

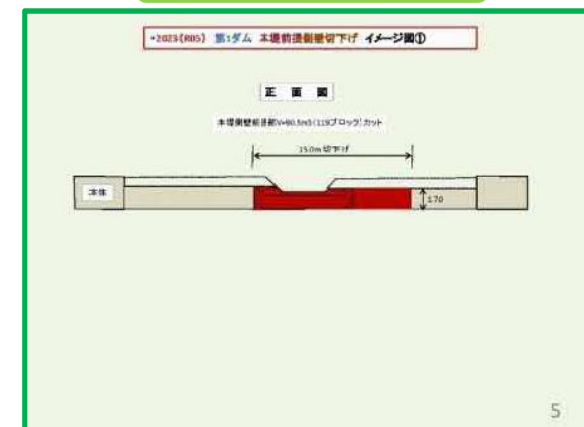


5

ルシャ川治山ダム改善方針ロードマップ 「施工順序」

	第1ダム	第2ダム	第3ダム	切り下げ 体積	モニタリング
2018年					防災機能 河川護岸 直観モニタリング
2019年				第1ダム 10m <sup>3</sup> 第2ダム 10m <sup>3</sup> 合計 20m <sup>3</sup>	改善前 護土量 確保済
2020年				第2ダム 30m <sup>3</sup>	護土量 確保済
2021年				第2ダム 60m <sup>3</sup> 第1ダム 60m <sup>3</sup> より上流の 土砂盛積	護土量 確保済
2022年				第2ダム 60m <sup>3</sup> 第1ダム 60m <sup>3</sup> より上流の 土砂盛積	
2023年				第1ダム 10m <sup>3</sup> (1.5m)	
2024年				第1ダム 10m <sup>3</sup> (1.5m)	
2025年～2027年	ルシャ川河 口より上流の 土砂盛積				第1～3 ダム 切り下げ後

2

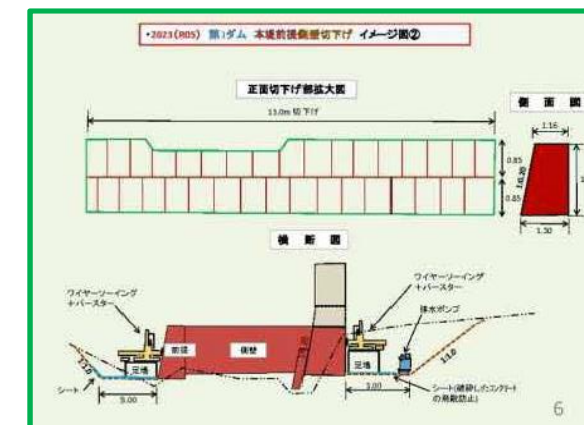


6

- 工事名：令和5年度ルシャ川小規模治山工事
- 工期：令和5年4月27日～令和5年12月8日
- 工事内容：第1ダム切り下げ、石組、一部開削
- 発注者：オホーツク総合振興局
- 受注者：斜里建設工業株式会社

# ルシャ川 小規模治山工事概要について《第3ダム 縦断図、横断図》(R5.7.19)

イメージ図②

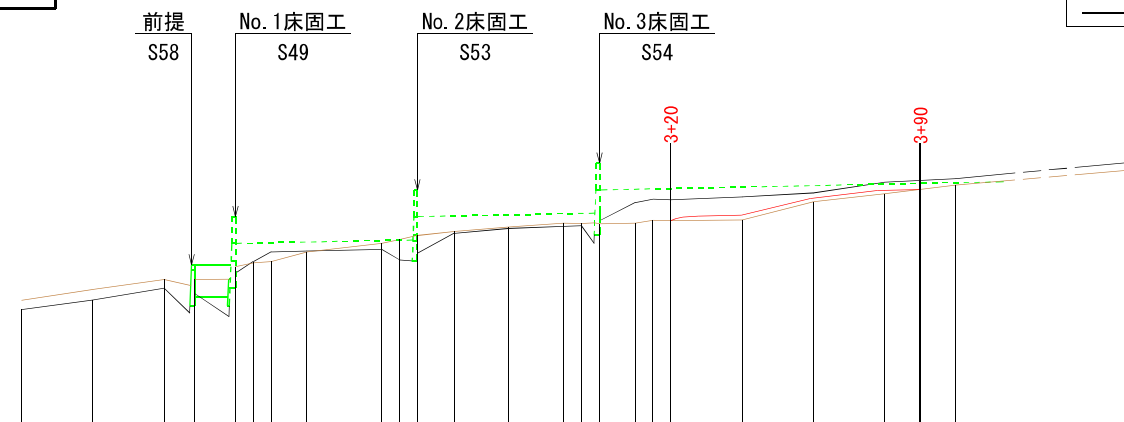

イメージ図③

