

# イワウベツ川 3号治山ダム切下げ 状況について

林野庁北海道森林管理局  
網走南部森林管理署

# 1. イワウベツ川位置図



# 令和5年度施工 (7号ダム)

放水路部分を1.6m切り下げた。

施工前




施工後




# No 3 号ダムの改良について



コンクリート切り下げ

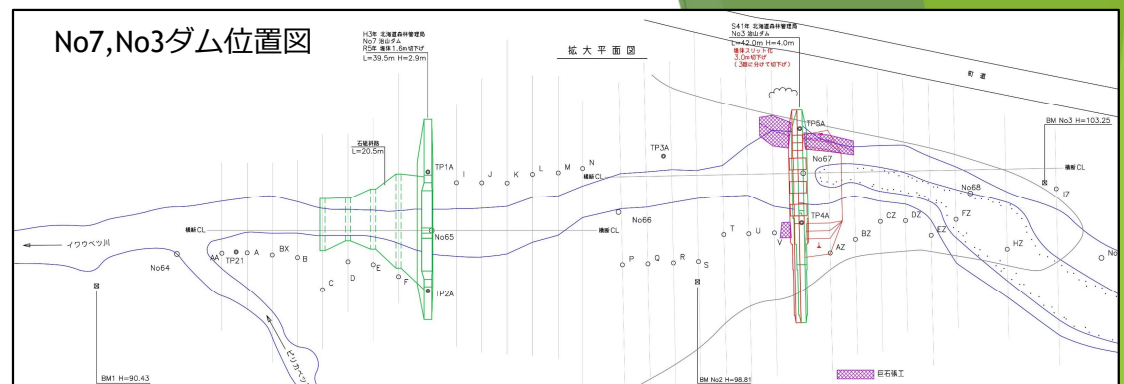


# No 3 号ダムの改良について

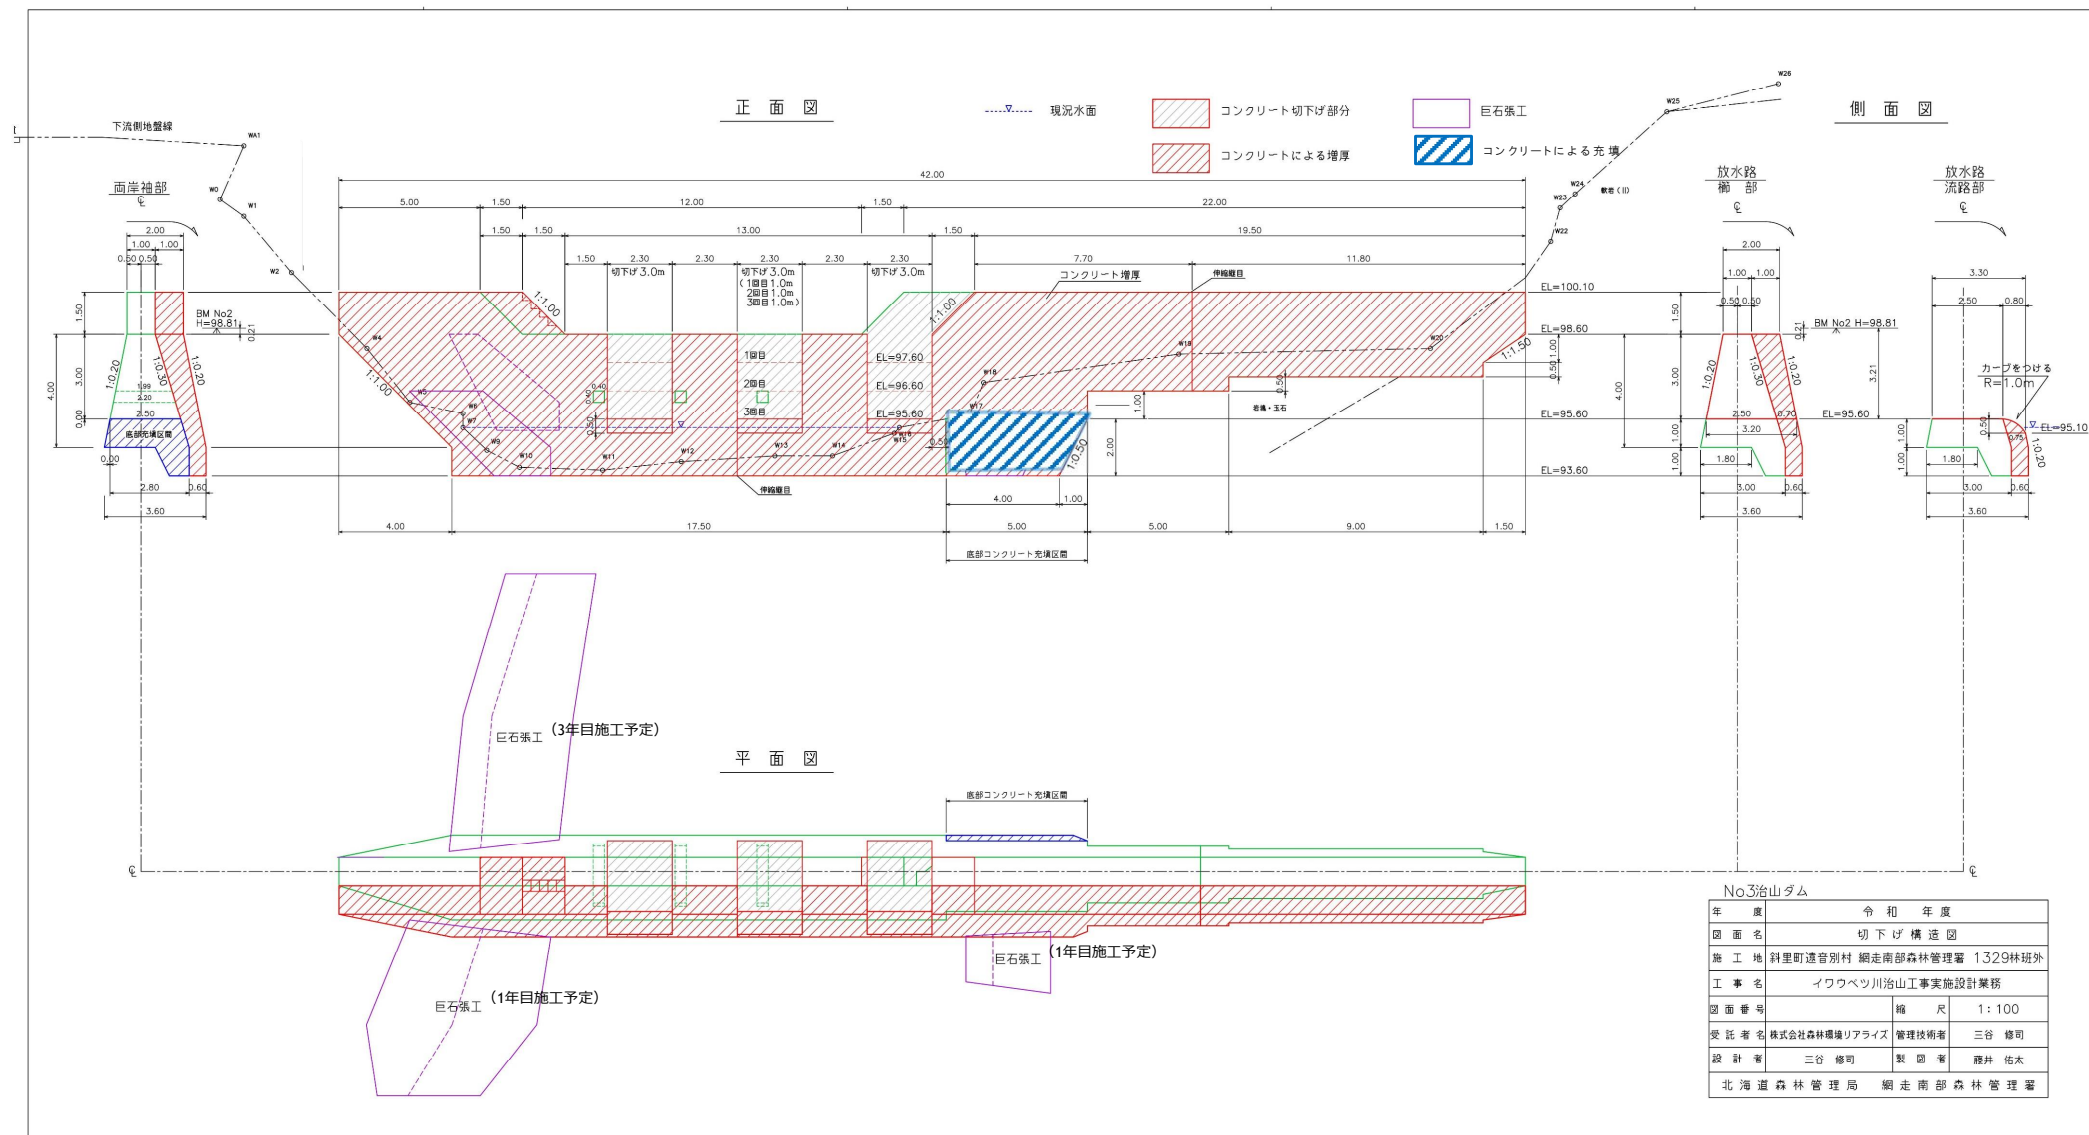



# 河川測量について

・令和5年度工事施工前に実施した測量を継続し、河床状況変化を観察する。  
(No55～No82の縦断測量と20箇所の横断測量を実施)

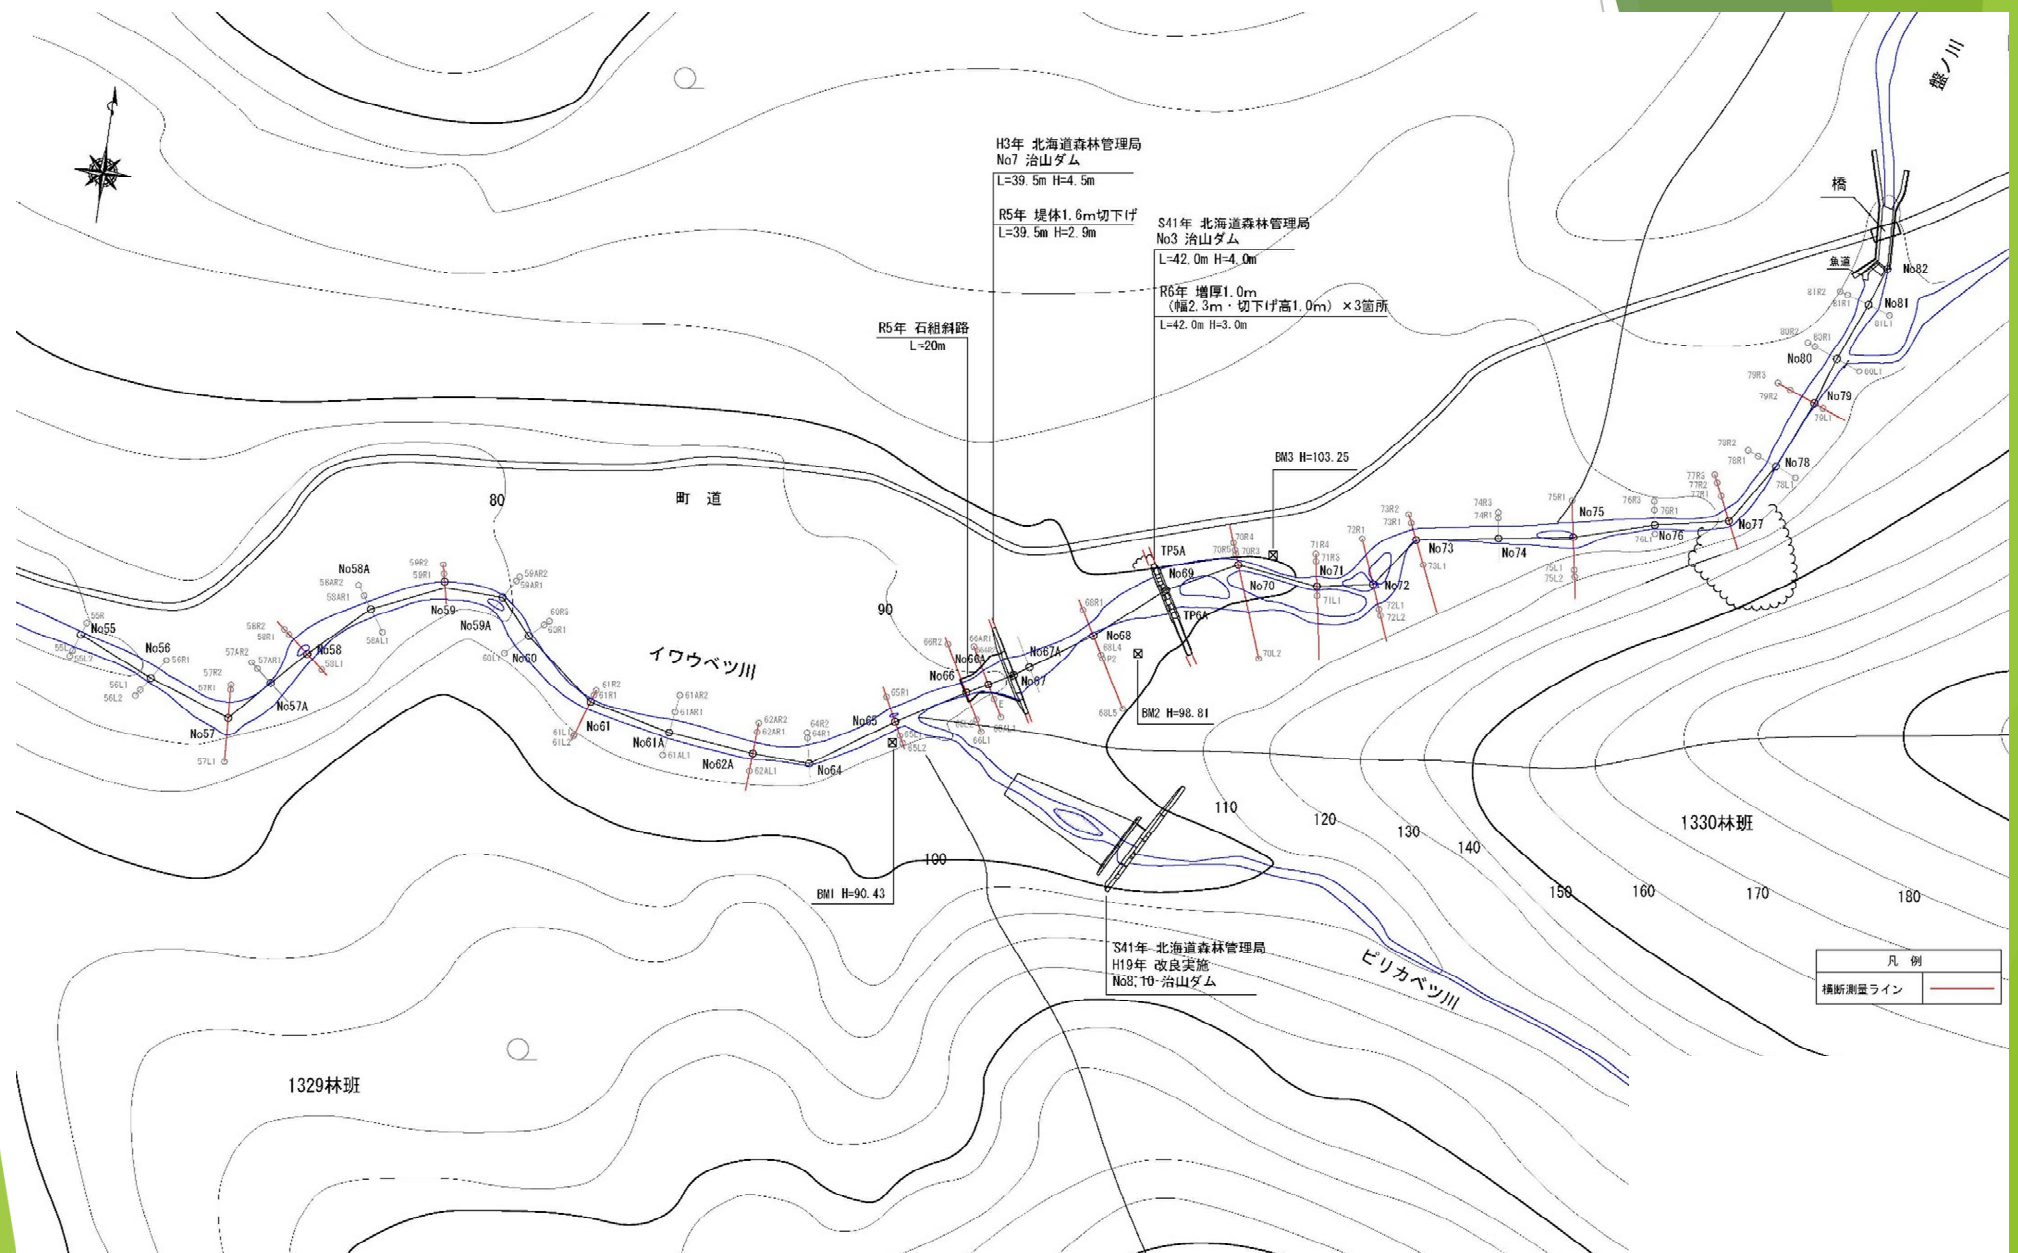

## 縦断図

S41年 北海道森林管理局  
No3 治山ダム

L=42.0m H=4.0m

R6年 增厚1.0m

(幅2.3m・切下げ高1.0m)×3箇所

L=42.0m H=3.0m

H3年 北海道森林管理局  
No7 治山ダム

L=39.5m H=4.5m


R5年 堤体1.6m切下以

L=39.5m H=2.9m


R5年  
石組斜路

$$L =$$

ピリカベツ川合流

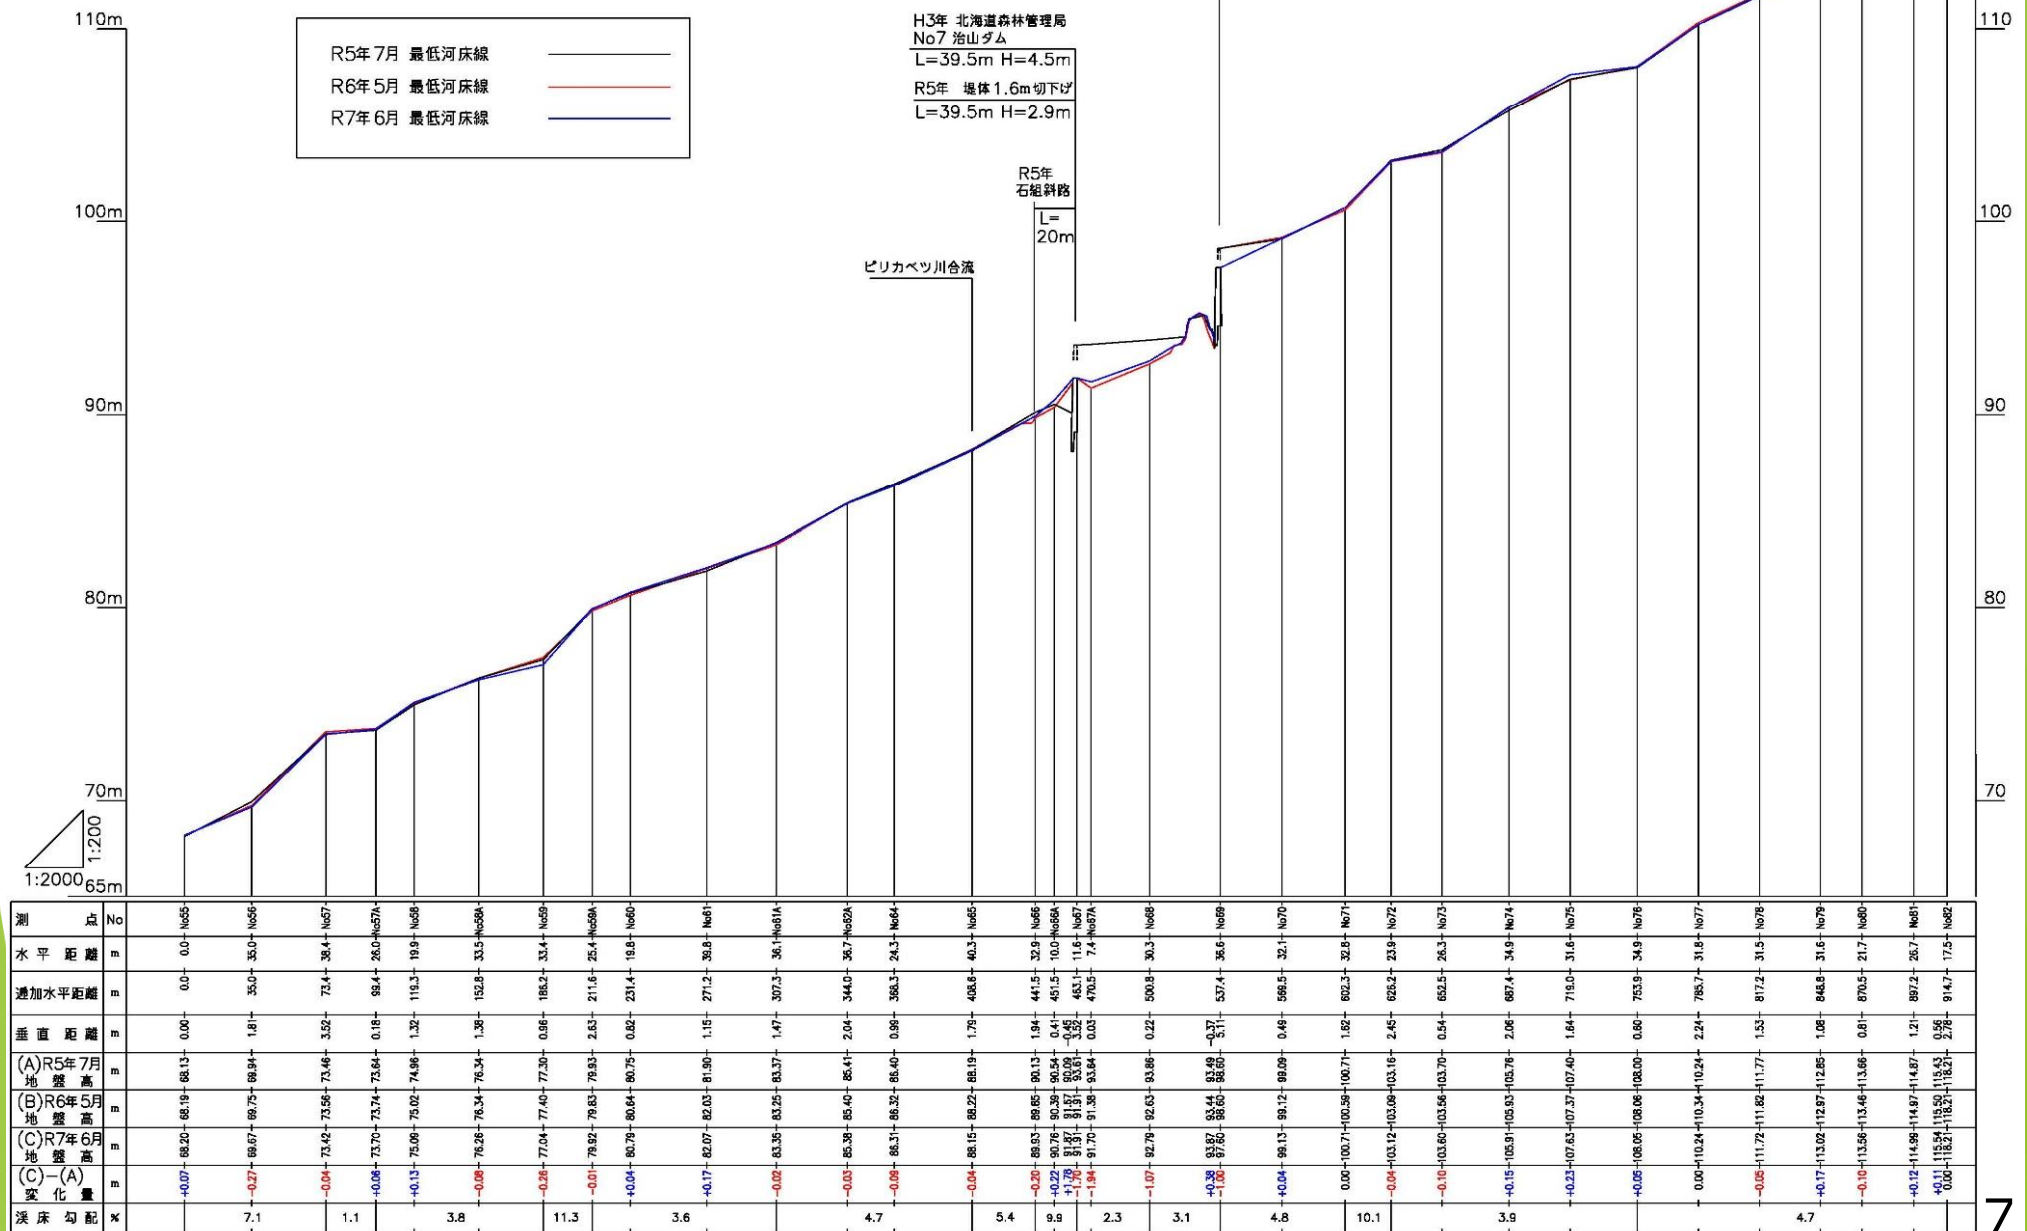

## 治山ダム改良スケジュール（案）について

| ダムNo   | 令和5年度<br>(2023)                                                                                  | 令和6年度<br>(2024)             | 令和7年度<br>(2025) | 令和8年度<br>(2026)     | 令和9年度<br>(2027) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| No7号ダム | 切下げ、石組斜路<br>改良済み                                                                                 |                             |                 |                     |                 |
|        |  縦横断測量         |                             |                 |                     |                 |
| No3号ダム |                                                                                                  | 堤体増厚<br>スリット（1回目）<br>下流側保護工 | スリット（2回目）       | スリット（3回目）<br>上流側保護工 |                 |
|        |  縦横断測量・改良効果検証等 |                             |                 |                     |                 |

※なお、地元関係機関等との調整結果及び年度毎の予算事情によりスケジュールの変更もありえる。
