

## 知床五湖園地看板等の整備について（環境省）

### 1. 知床五湖園地誘導標識設置工事（進行中）

概要：五湖駐車場から高架木道に誘導するための看板を設置するもの。

工事名：令和 2 年度（繰越）知床五湖園地誘導標識設置工事



工期：2021 年 11 月 26 日～2022 年 3 月 25 日

工事費：9,130,000 円

（実施設計費：1,628,000 円：令和元年度知床五湖園地誘導標識設計業務）

委託業者：斜里建設工業株式会社

位置及びデザイン：下段を参照。

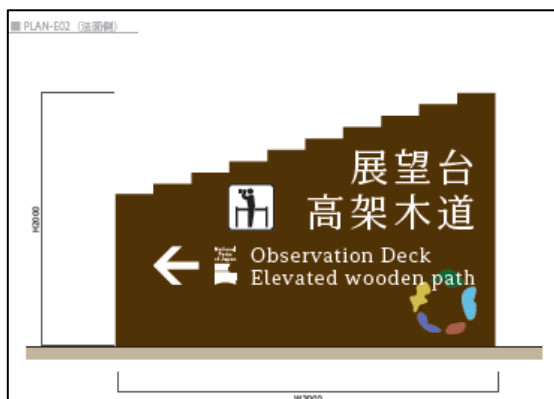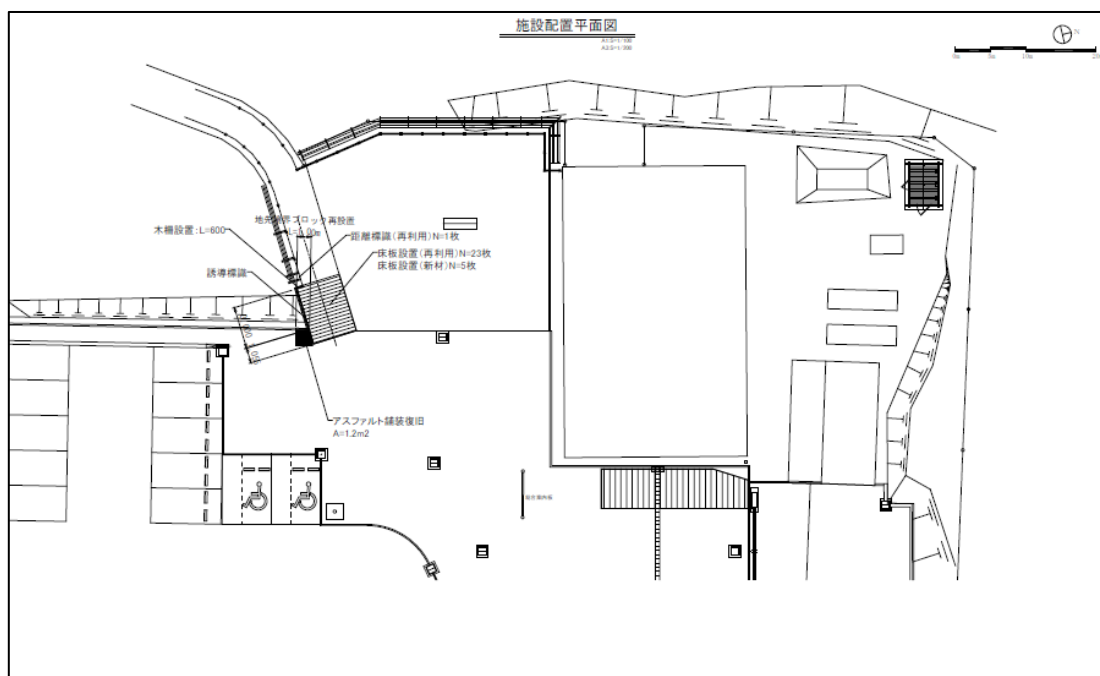

駐車場からみた面



高架木道入口広場から見た面

## 2. 五湖園地案内大看板の修繕（R4年度実施予定）

概要：2021年11月10日の暴風雨で、知床五湖フィールドハウスとパークサービスセンター間にある大看板が強風で破損。盤面吹き飛ばされる被害があった。応急措置としてフレームはロープで固定したが、折れ、ゆがみ、留め金の故障により、フレームが完全には閉まらない状態であるため、来シーズンに盤面のフレーム（表裏）の取替えを予定。

状況：下段の写真を参照。



大看板正面



大看板裏面



フレームのゆがみ



裏面の飛ばされた看板はFH裏、PSC横に仮置き中。

### 3. 高架木道改修（未確定\_次年度以降）

概要：環境省の長寿命化施設として対象になっている知床五湖高架木道（H17～整備）において、R3 年度業務で劣化部分調査及び必要部分の改修設計業務を実施した。

事業名：令和3年度知床国立公園知床五湖園地高架木道改修設計業務

工期：2021年7月20日～2022年1月28日

事業費：2,530,000円

調査方法：目視、打診、触診、非破壊試験（応力波速度測定器による確認）

調査結果：健全性Ⅰ～Ⅳ段階のうち、Ⅰ及びⅡで概ね良好。ただし、次の損傷・劣化が見られる。  
 ①H17年整備箇所において傾斜を確認。大きな損傷はないが、湿地帯にかかっている基礎の一部に地盤沈下や破損が見られる。  
 ②部分的に床板や手すりの損傷（ささくれ、割れ、そり）が見られる。  
 ③高架木道入口と駐車場との接点の陥没（※「知床五湖園地誘導標識設置工事」であわせて応急的に補修予定。）

改修計画：H17年整備区間の一部の床板・手すりの貼り替え、基礎工の実施。再生木材の利用やバリアフリー対応のため、別途手すりをつけること等を検討中。

